GORKHA DISTRICT PROGRESS STATUS - PHASE 1

% Complete	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Actual Start	Actual Finish
100%	**Gorkha-District**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**
100%	**School ID-63 ((3S-9C), (2-LaLiEM), (MH), (TC(M)))**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**
100%	**School ID-65 ((3S-9C), (2S-4C), (2-LaLiEM), (TC(M)))**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**
100%	**School ID-66 ((3S-9C), (2S-4C), (TC(M)))**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**	**Mon 12/17/18**	**Fri 9/25/20**

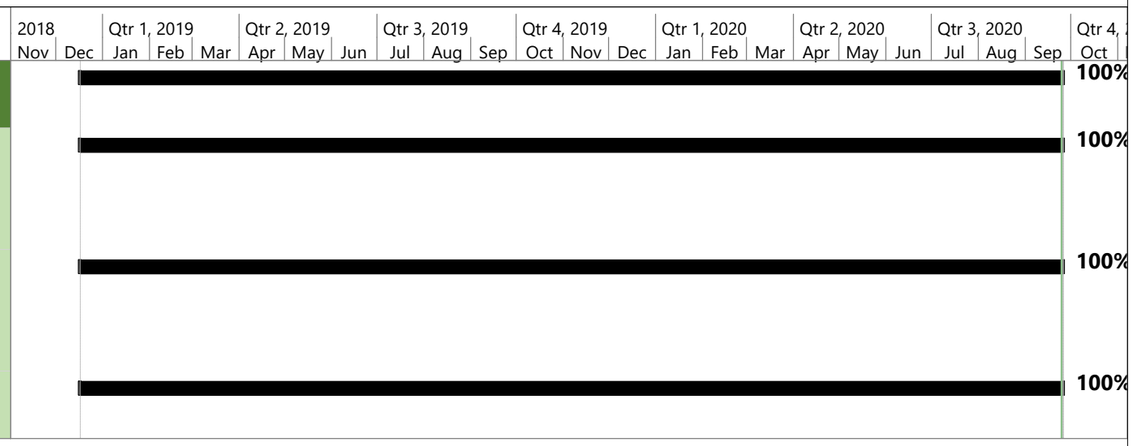

Project: Master Schedule_R0_Ju
Date: Wed 10/11/23

Task	Project Summary	Manual Task	Finish-only	Progress
Split	Inactive Task	Duration-only	External Tasks	Manual Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary	External Milestone	Completed
Summary	Inactive Summary	Start-only	Deadline	
